地域再生計画（地方創生汚水処理施設整備推進交付金）の事後評価について

経済環境部　環境政策課
上下水道局　経営企画課

ひたちなか市地域におけるきれいな水環境推進計画

計画期間　令和2年～6年度　　**地域再生の区域**　市内全域

◆目標

○ 汚水処理施設の整備の促進

88.8%(平成30年度末) → 93.7%(令和6年度末)

○ 河川環境基準測定地点(4地点×12回)における透視度(50度以上)

66.6%(平成30年度末) → 75.0%(令和6年度末)

◆取組

○ 下水道及び浄化槽の整備

公共下水道　管径 φ200~250mm

管きょ　L=3,000m→L=4,226m(令和5年度変更)


浄化槽　1,250基

事後評価について


◆目標値

指標		基準値（H30）	中間年度（R4）	最終年度（R6）
1.汚水処理人口普及率	目標値（%）	-	91.3	93.7
	実績値（%）	88.8	92.1	93.0
2.透視度	目標値（%）	-	70.8	75.0
	実績値（%）	66.6	81.3	83.3

※実施事業	計画	中間年度	最終年度
公共下水道事業（整備延長m）	4,226	1,522.3	4,766.3
個人設置型浄化槽整備事業（整備基数）	1,250	648	1,030

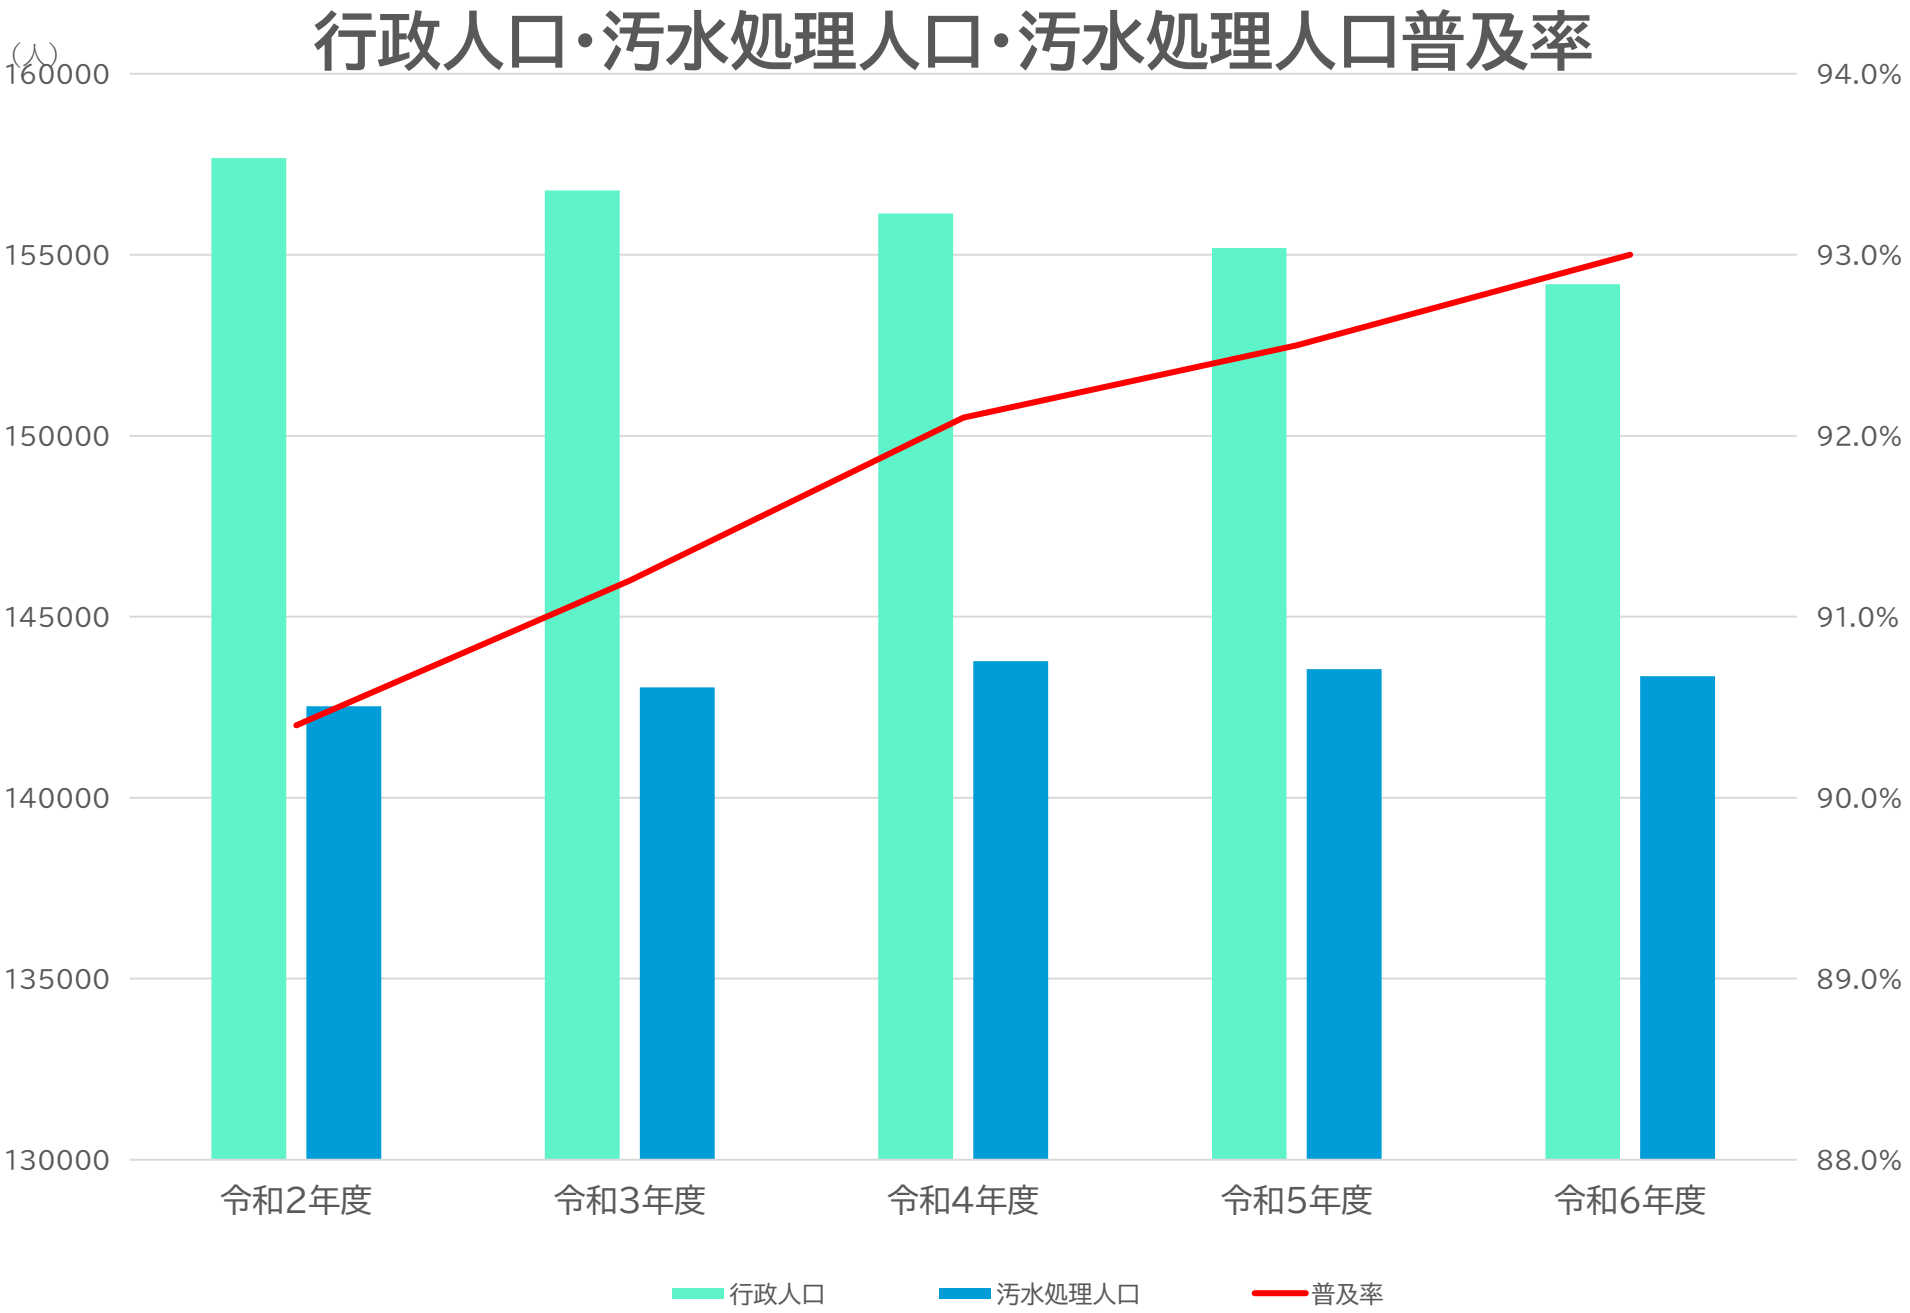
行政人口・汚水処理人口・汚水処理人口普及率
(人)
160000
155000
150000
145000
140000
135000
130000
94.0%
93.0%
92.0%
91.0%
90.0%
89.0%
88.0%
令和2年度
令和3年度
令和4年度
令和5年度
令和6年度
行政人口
汚水処理人口
普及率

【地方創生汚水処理施設整備推進交付金(内閣府)】

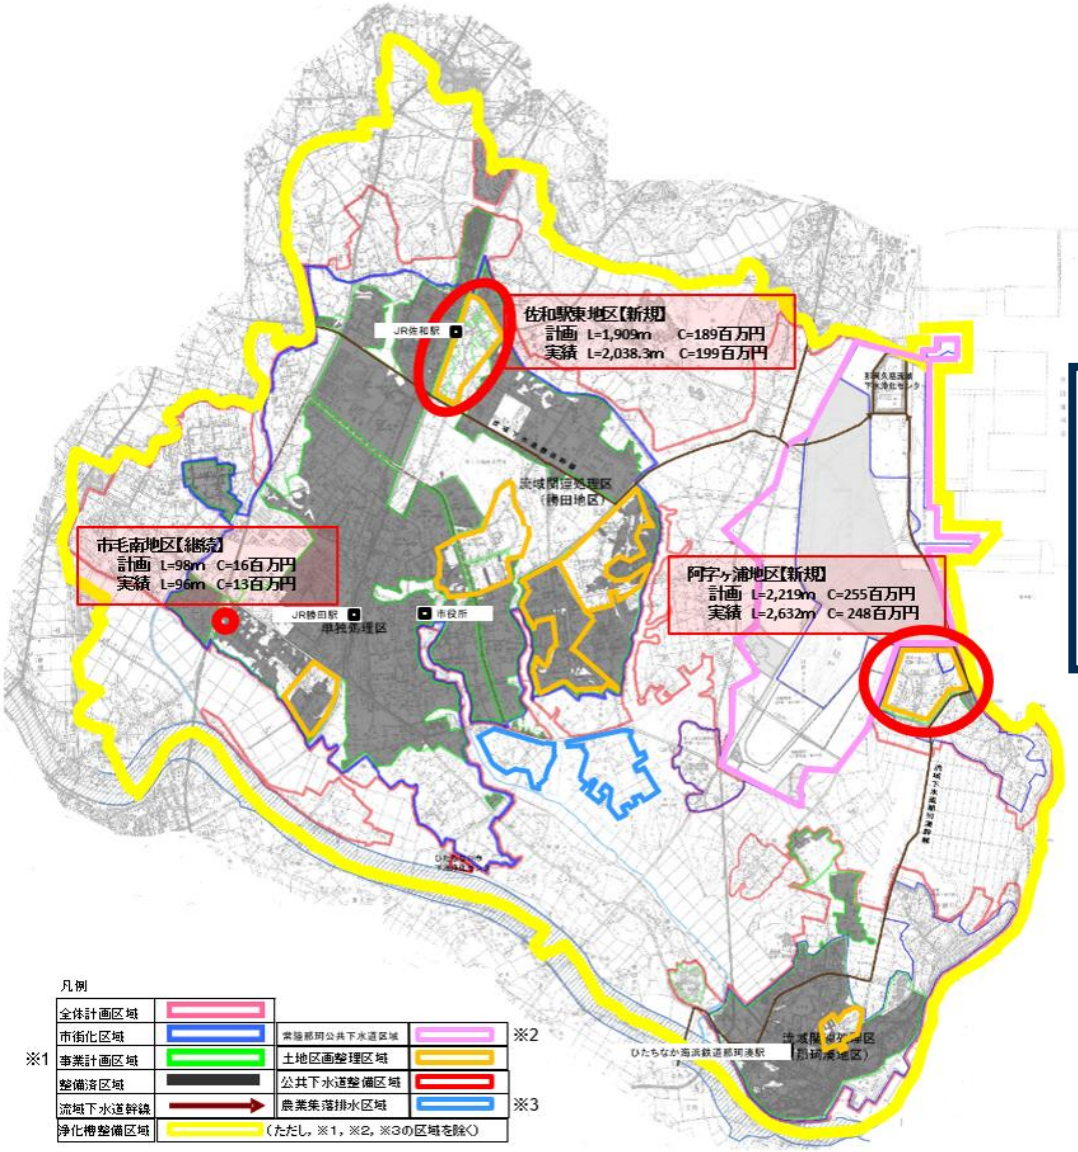


総事業費　848.296百万円
（うち国費　359.43百万円）

公共下水　460百万円
（うち国費　230百万円）


浄化槽　388.296百万円
（うち国費　129.43百万円）

佐和駅東地区

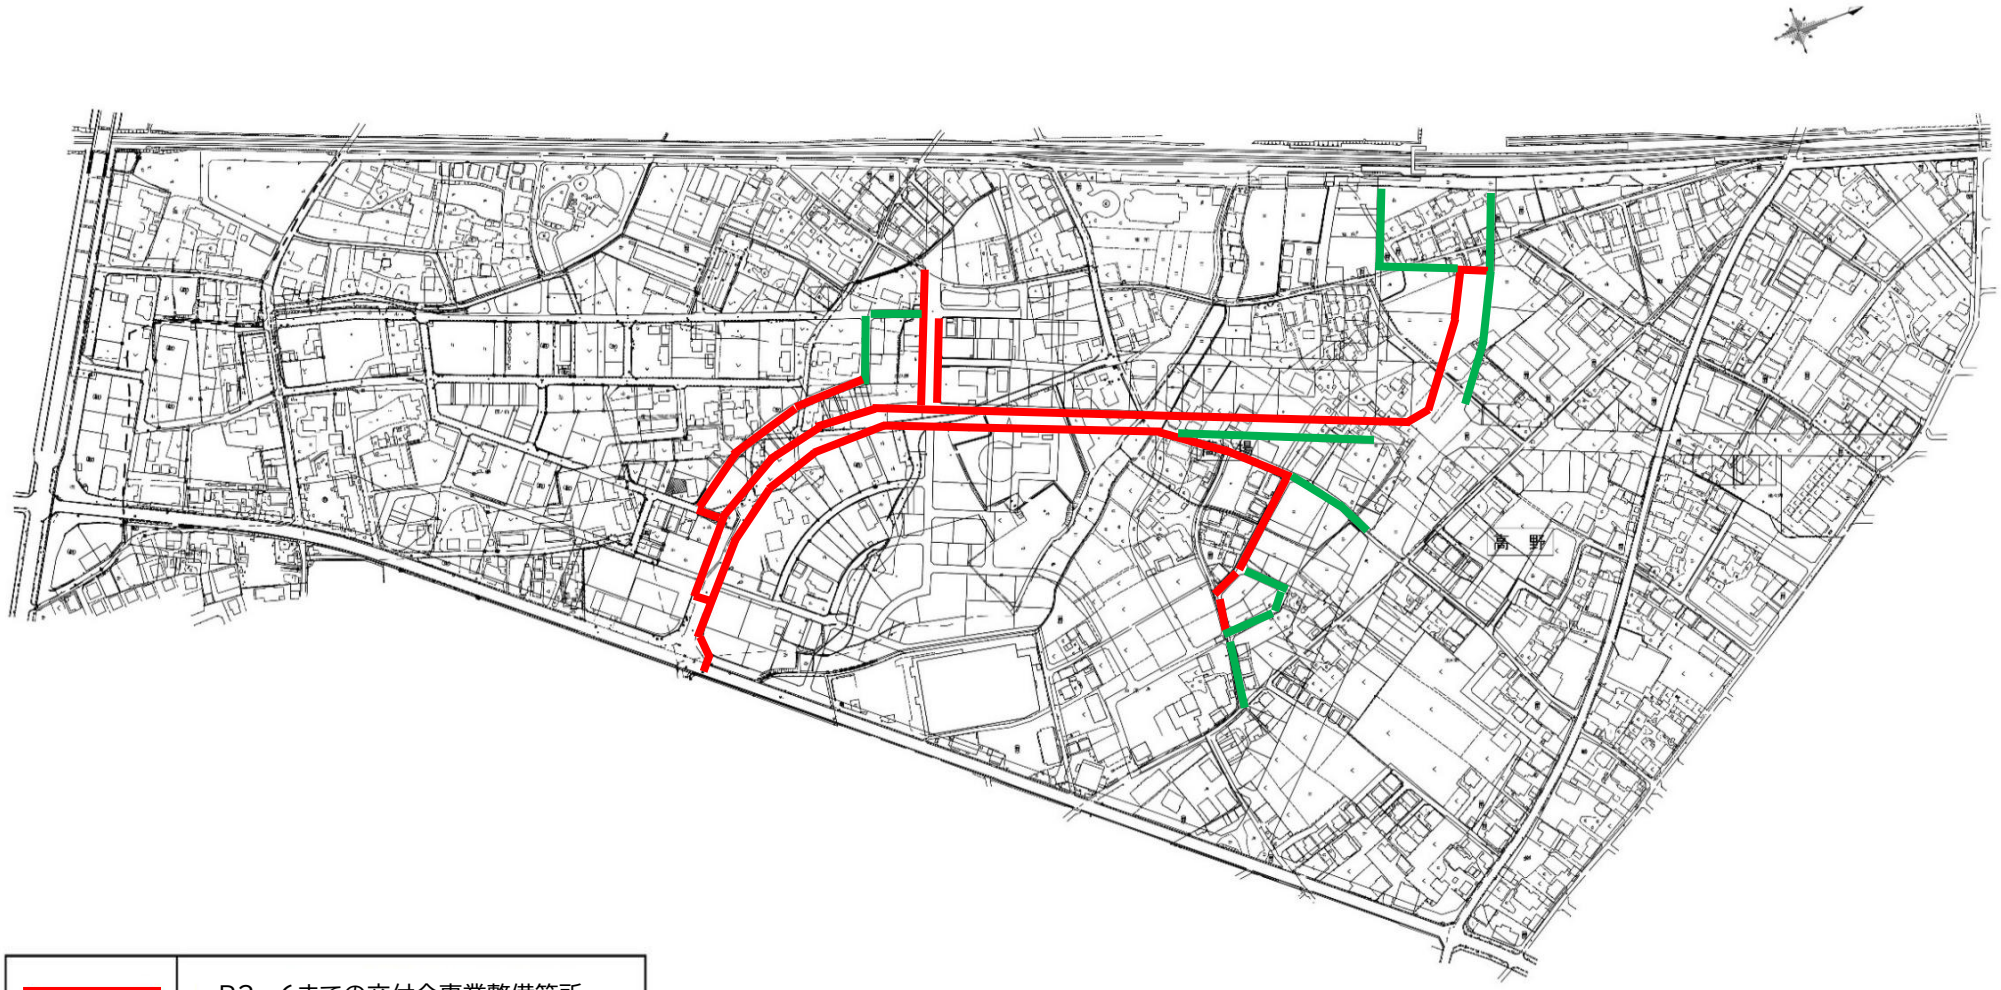


	R2～6までの交付金事業整備箇所
	R2～6までの単独事業整備箇所


市毛南地区

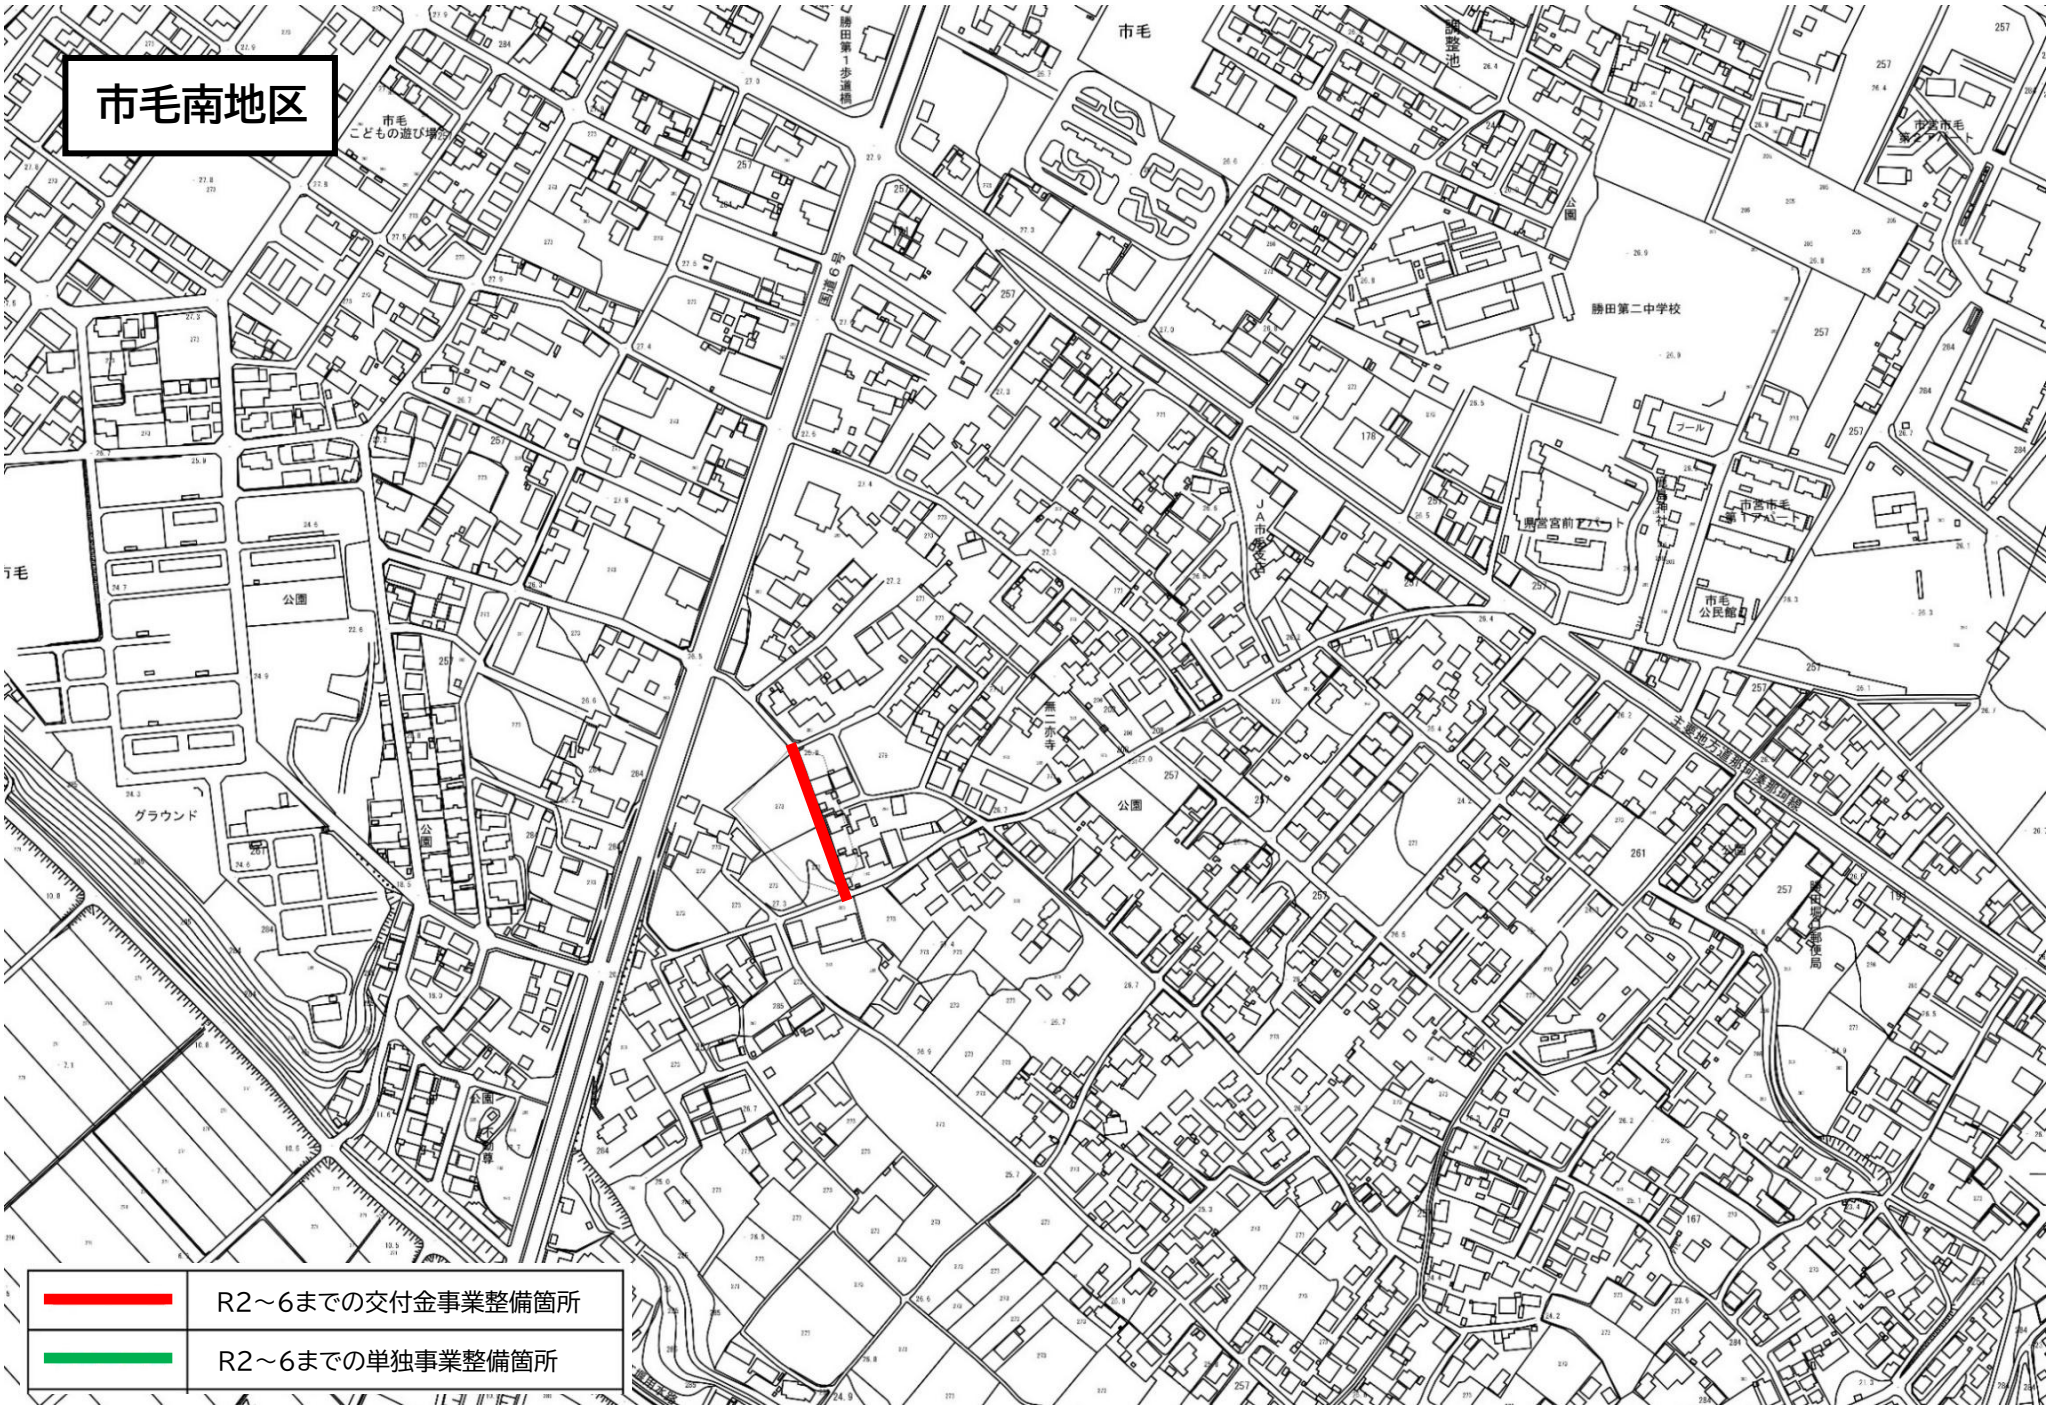
市毛
こども遊び場
勝田第1歩道橋
市毛
調整池
公園
勝田第二中学校
プール
市営市毛第2アパート
県営宮前アパート
JA市毛支店
市毛公民館
無二庵寺
公園
グラウンド
公園
公園
主要地方道那珂湊那珂線
勝田駅北部住宅
R2～6までの交付金事業整備箇所
R2～6までの単独事業整備箇所

阿字ヶ浦地区

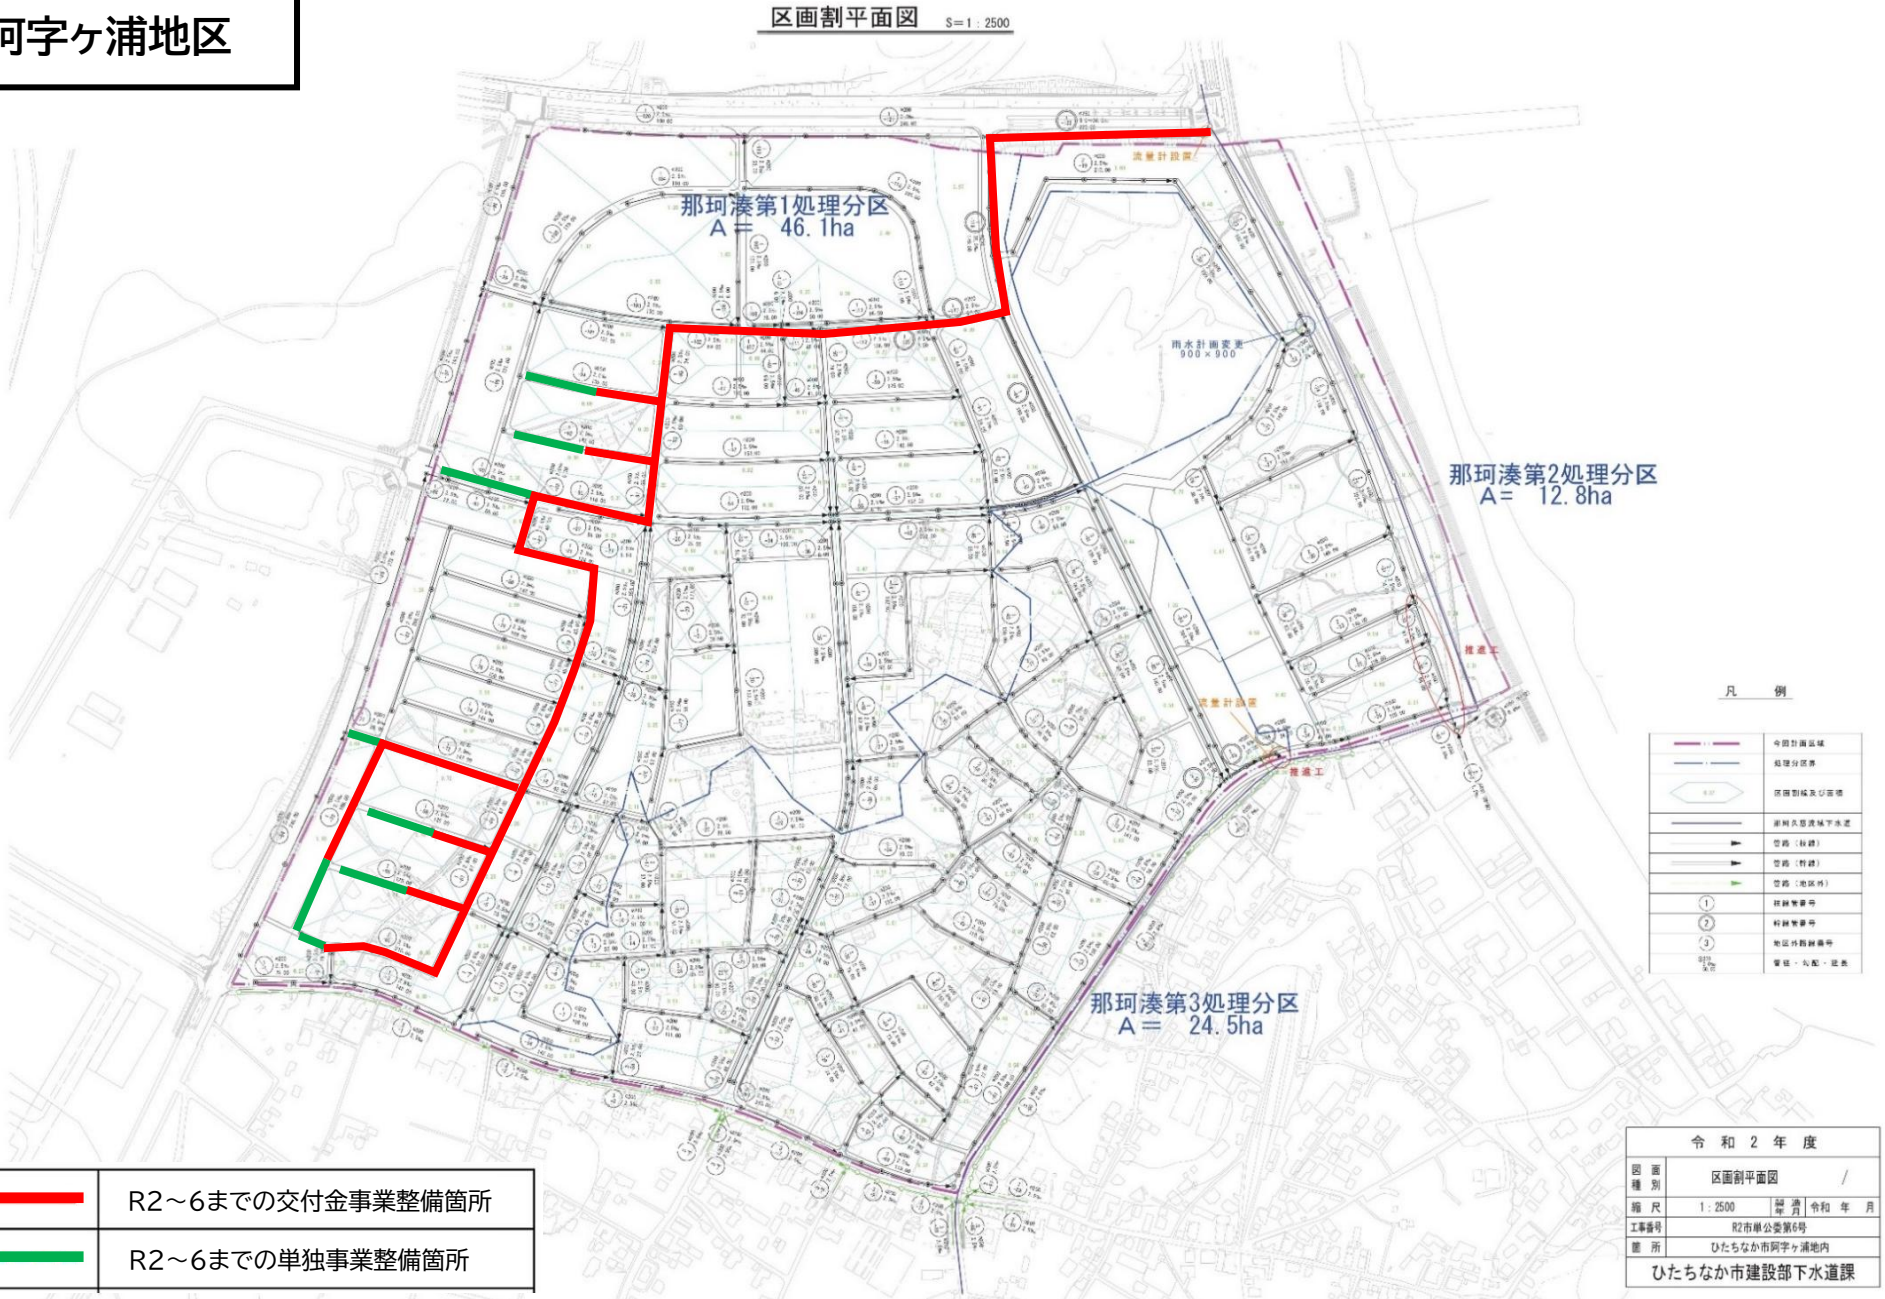
区画割平面図 S=1:2500
那珂湊第1処理分区
A= 46.1ha
那珂湊第2処理分区
A= 12.8ha
那珂湊第3処理分区
A= 24.5ha
流量計設置
雨水計画変更
900×900
推進工
凡例
R2～6までの交付金事業整備箇所
R2～6までの単独事業整備箇所
令和2年度
図面種別 区画割平面図
縮尺 1:2500
工事番号 R2市単公委第6号
箇所 ひたちなか市阿字ヶ浦地内
ひたちなか市建設部下水道課

【地方創生汚水処理施設整備推進交付金(内閣府)】

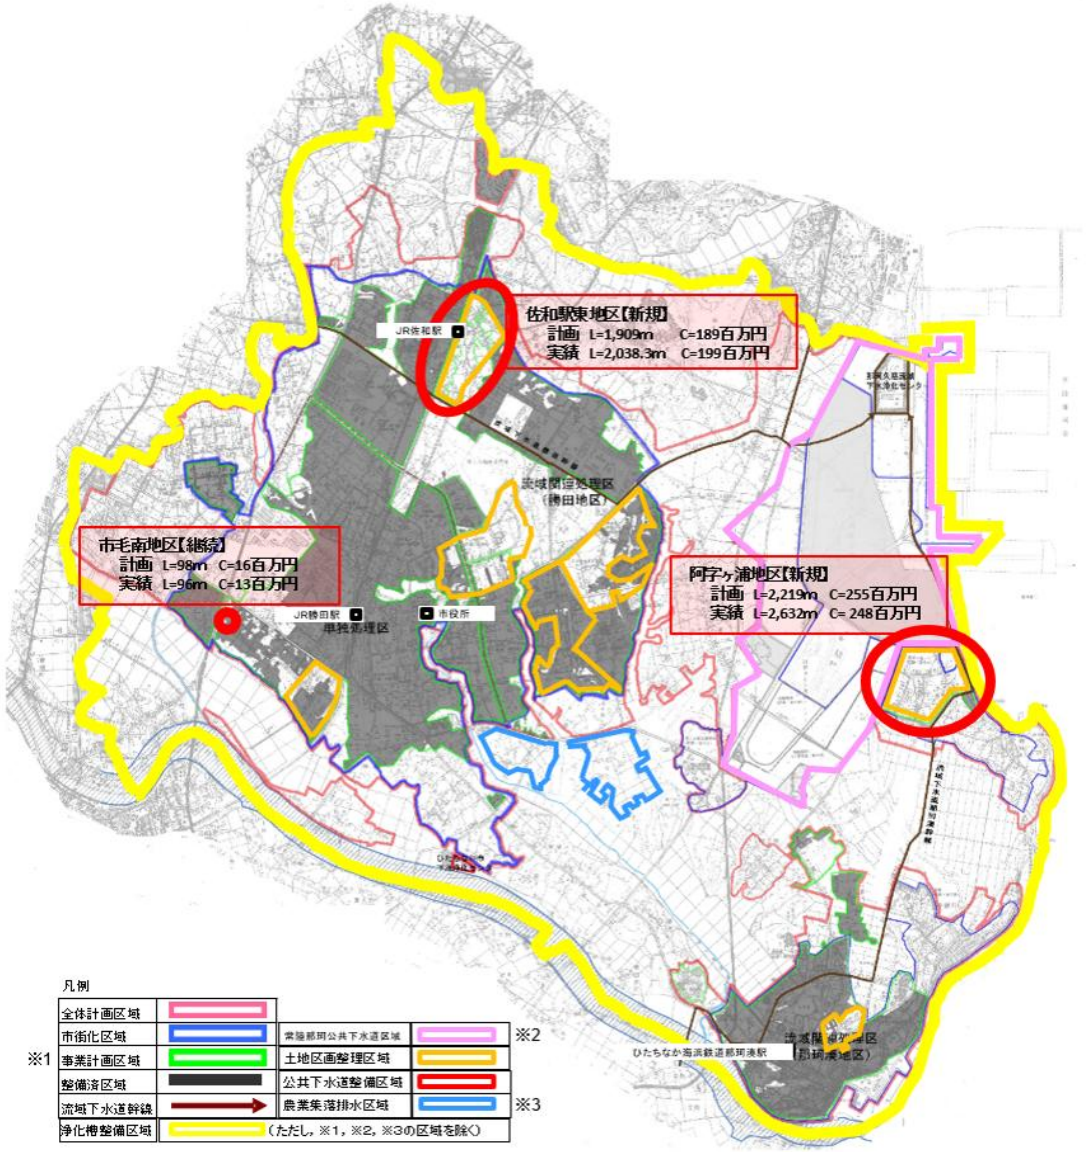

総事業費　848.296百万円
(うち国費 359.43百万円)

公共下水　460百万円
(うち国費 230百万円)

浄化槽　388.296百万円
(うち国費 129.43百万円)

個人設置型浄化槽整備事業

補助対象者を市の汚水処理人口普及率の向上につながる者に限定

補助メニュー	金額(円)
5人槽	332,000
7人槽	414,000
10人槽	548,000
単独浄化槽撤去	120,000
汲み取り便槽撤去	90,000
宅内配管工事	300,000

R4年度から

・補助金の額増額
5人槽　:294,000円 ⇒ 332,000円
7人槽　:342,000円 ⇒ 414,000円
10人槽:459,000円 ⇒ 548,000円

・補助メニューの新設
汲み取り便槽撤去
90,000円
宅内配管工事
300,000円

個人設置型浄化槽整備事業整備件数

補助件数内訳	H30 (基準)	R2	R3	R4	R5	R6	最終実績
浄化槽 補助件数(件)	232	190	230	228	208	174	**1,030**
単独浄化槽 撤去件数(件)	19	23	24	27	33	16	**123**
汲み取り便槽 撤去件数(件)	-	-	-	16	7	6	**29**
宅内配管 工事件数(件)	-	-	-	46	45	25	**116**

その他の事業

公共下水道水洗化普及啓発事業

・水洗化普及員（専属職員2名）を雇用
・日常的に下水道未接続世帯や接続率の低い地区を重点的に訪問


環境シンポジウム

環境教育・環境学習の推進

・環境副読本の作成及び配付
・環境シンポジウムの開催
・環境学習、環境講座の開催


環境学習


環境保全活動の推進

・海岸クリーン運動、地域清掃活動


海岸クリーン運動

ひたちなか市地域におけるきれいな水環境推進計画

今後も、生活排水処理施設の整備に努めるとともに、事業所の排水状況の監視及び、より詳細な河川の水質検査の実施に努めていく。



「ひとが咲くまち。ひたちなか」居住環境推進計画

（令和7年度～令和11年度）

充実した社会インフラを確保
